

Raport ze sprintu nr 5 - Calisia Banking App

Data raportu: 25.05.2026

Okres sprintu: 20.05 - 25.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Michał Nuckowski

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Olszewski Dawid
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub

Product Owner i Scrum Master sprintu

Michał Nuckowski

Sprint Planning

Kod	Historyjka	SP	Status
S5-01	Endpoint dashboardu klienta	8	Done
S5-02	Kafelki produktów i saldo łączne w UI	5	In Progress
S5-03	Projekcje zdarzeń domenowych do read modelu	13	Done
S5-04	Oś czasu zdarzeń w dashboardzie	5	Done

Sprint Review

Cel sprintu: Dashboard i model odczytowy. Pokazanie klientowi aktualnego stanu produktów (kont, kart i kredytów), salda łącznego i ostatnich zdarzeń (np. zasilenie konta z poziomu API) w panelu bankowości.

Zakres sprintu obejmował 4 historyjki o łącznej estymacji 31 SP - z czego 3 historyjki zostały dowiezione ze statusem Done, a 1 z statusem In Progress, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 26 SP.

Dostarczono dashboard klienta oparty o model odczytowy: saldo łączne, kafelki dla kont bankowych oraz oś czasu zdarzeń. Nie udało się w pełni zaimplementować kafelków dla kart oraz kredytów. Projekcje poprawnie aktualizują dane widoczne w panelu po operacjach takich jak zasilenie konta, wywoływanych bezpośrednio z poziomu API (backendu).

Sprint skutecznie połączył logikę domenową z widokiem klienta. Użytkownik otrzymał czytelny obraz swoich produktów i historii zdarzeń, a zespół potwierdził sens rozdzielenia write modelu i read modelu.

Najważniejsze rezultaty / Przyrost

- Dodano i zintegrowano endpoint dashboardu klienta.
- Wyświetlono kafelki dla kont bankowych i saldo łączne.
- Wdrożono model odczytowy i pomyślnie zaimplementowano projekcje zdarzeń domenowych.
- Udostępniono i przetestowano oś czasu ostatnich zdarzeń.
- Udowodniono działanie przepływu: od modelu zapisu, przez outbox, aż po widok frontendu.

Sprint Retrospective

Sprint pokrywał się dla wielu członków zespołu ze zjazdem na Uczelni, co było ogromnym testem dla naszej elastyczności, planowania i komunikacji asynchronicznej. Mimo dużego obciążenia obowiązkami zewnętrznymi, udało się utrzymać stabilny poziom energii. Zespół wykazał się dużą empatią i wzajemnym wsparciem. Pewne problemy techniczne (np. synchronizacja danych) powodowały niepotrzebny stres na koniec sprintu, co wynikało z niedoszacowania skomplikowania tych zadań.

Co się udało

- Bardzo dobra komunikacja i wzajemne zastępowanie się podczas nieobecności związanych z uczelnią.
- Zespół nie stracił motywacji pomimo trudności z nowymi koncepcjami technicznymi (projekcje, outbox).
- Wspólny zjazd akademicki paradoksalnie poprawił komunikację i zintegrował nas jeszcze bardziej – co bardzo pomogło w budowaniu zaufania.
- Odważnie przyznaliśmy, że część zakresu (karty i kredyty) musi zostać przeniesiona, zamiast wdrażać niedokończone rozwiązania po nocach.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,1/5.

Jak na sprint realizowany w cieniu zjazdu na uczelni, energia była zaskakująco stabilna i wysoka. Zmęczenie fizyczne i natłok obowiązków były odczuwalne pod koniec iteracji, ale satysfakcja z dowieszenia głównej wartości na dashboardie rekompensowała stres. Największym "pożeraczem" energii była frustracja przy synchronizacji modelu zapisu z frontendem – wymagało to wielu prób i błędów, co bywało przytłaczające przy ograniczonym czasie wolnym.

Czego udało się nauczyć

- Zrozumieliśmy, że zadania z wieloma "niewiadomymi" (np. kafelki dla kart i kredytów) wymagają rozbicia na mniejsze części i estymacji z większym marginesem błędu.
- Nauczyliśmy się, że w tygodniach zjazdowych musimy planować mniejsze "Capacity" (moce przerobowe) i brać mniej Story Pointów na sprint.
- Techniczne zgrzyty na styku backend-frontend pokazały nam, że potrzebujemy częstszych, szybkich synchronizacji (np. krótkich calli "pair programming") zamiast samodzielnego blokowania się godzinami.

Wnioski i działania na kolejny sprint / Action Items


- **Proces:** Rygorystycznie przeliczać dostępność członków zespołu (Capacity) przed planowaniem, uwzględniając kalendarz akademicki.
- **Proces:** Rozbijać większe zadania na mniejsze, a w przypadku nowych technologii dodawać zadania typu "Spike" (badawcze) dla lepszego oszacowania pracy.
- **Dobre praktyki:** Rozszerzać testy integracyjne oraz przypadki w Bruno od razu przy tworzeniu endpointów, aby oszczędzić nerwów na koniec sprintu.
- **Dobre praktyki:** Wprowadzić zasadę, że kiedy będziemy implementować przelewy, od razu będziemy sprawdzać wpływ operacji na read model, aby uniknąć błędów regresji.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Dawid Olszewski


Główny cel następnego sprintu: Przelewy własne i zewnętrzne. Pozwolenie klientowi na wykonywanie przelewów oraz odzwierciedlanie ich w saldach i historii.

Zrzuty ekranu

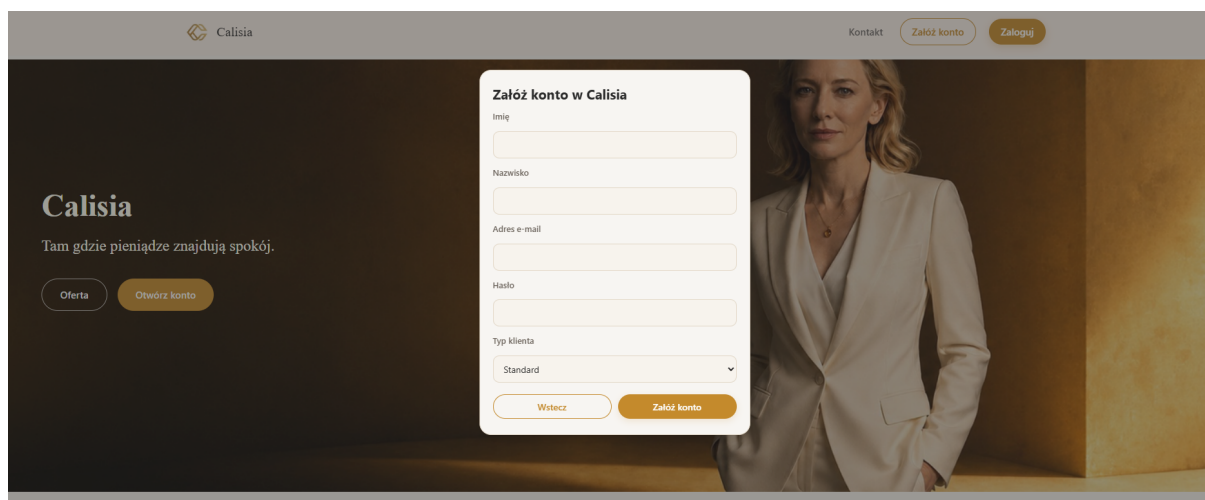


The screenshot shows the Calisia website with a registration form overlay. The form is titled "Załącz konto w Calisia" and contains the following fields: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Hasło, and Typ klienta (with a dropdown menu showing "Standard"). There are "Wstecz" and "Załącz konto" buttons at the bottom of the form. The background of the website features a woman in a white blazer and the Calisia logo with the tagline "Tam gdzie pieniądze znajdują spokój." and "Oferta" and "Otwórz konto" buttons.


Rysunek 1: Rejestracja użytkownika.

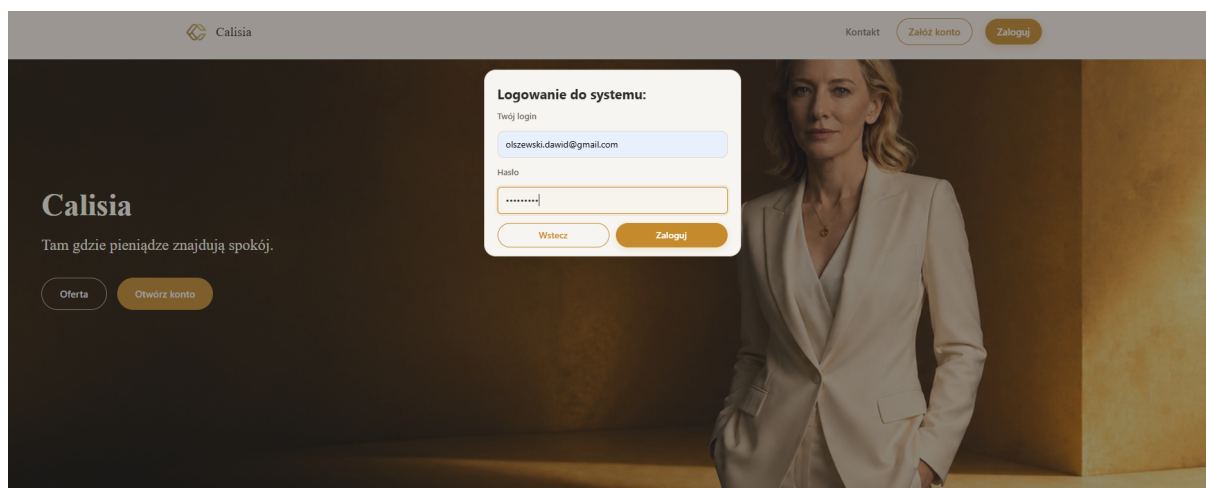

Rysunek 2: Logowanie użytkownika.

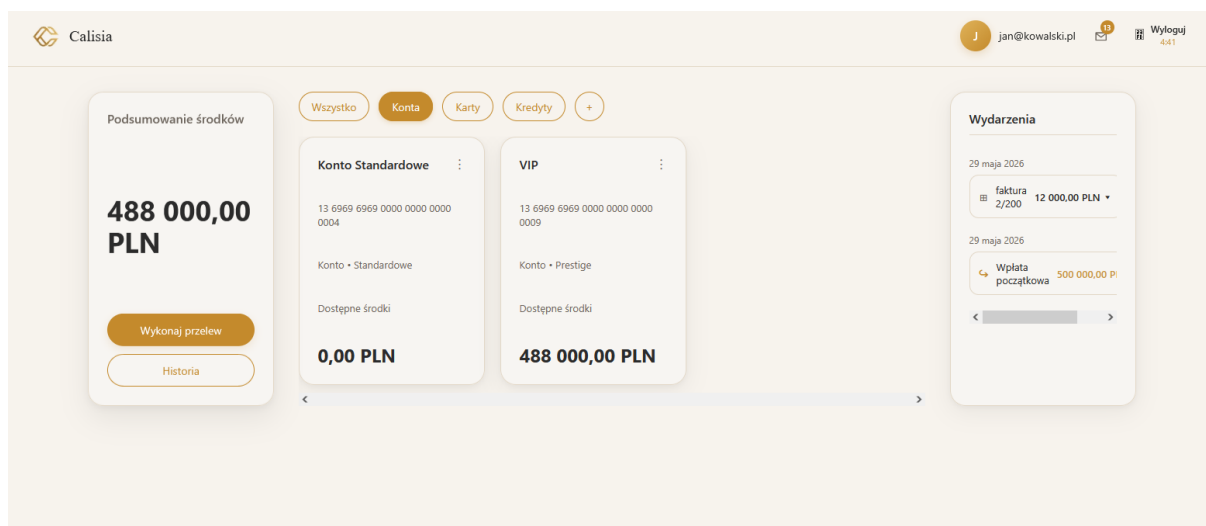

Rysunek 3: Dashboard użytkownika.

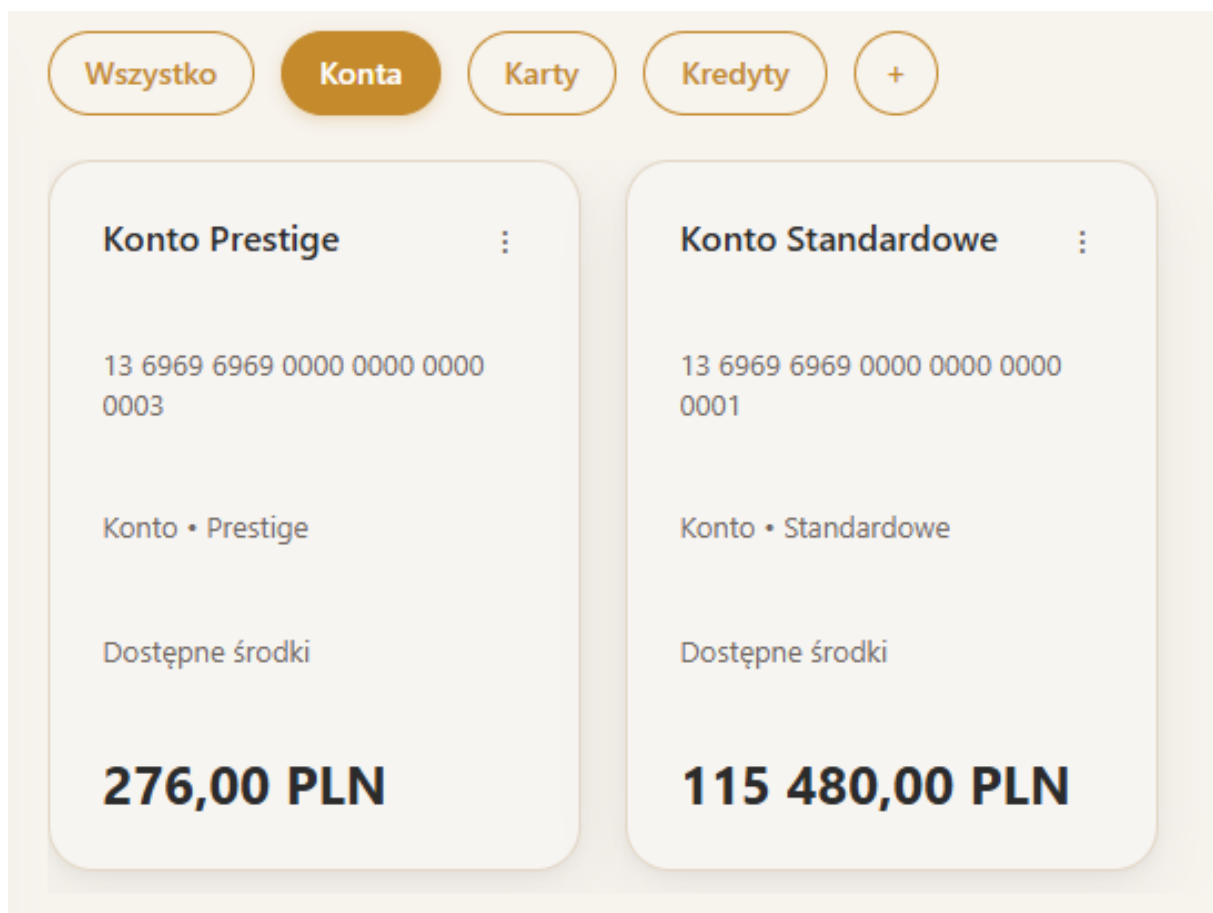

Rysunek 4: Konta użytkownika.
